令和８年度 千葉港湾事務所
事業概要

令和8年7月14日

国土交通省関東地方整備局
千葉港湾事務所

■千葉県の港湾

国際拠点港湾	千葉港
重要港湾	木更津港
地方港湾	上総湊港 浜金谷港 館山港 興津港（避難港） 名洗港（避難港）

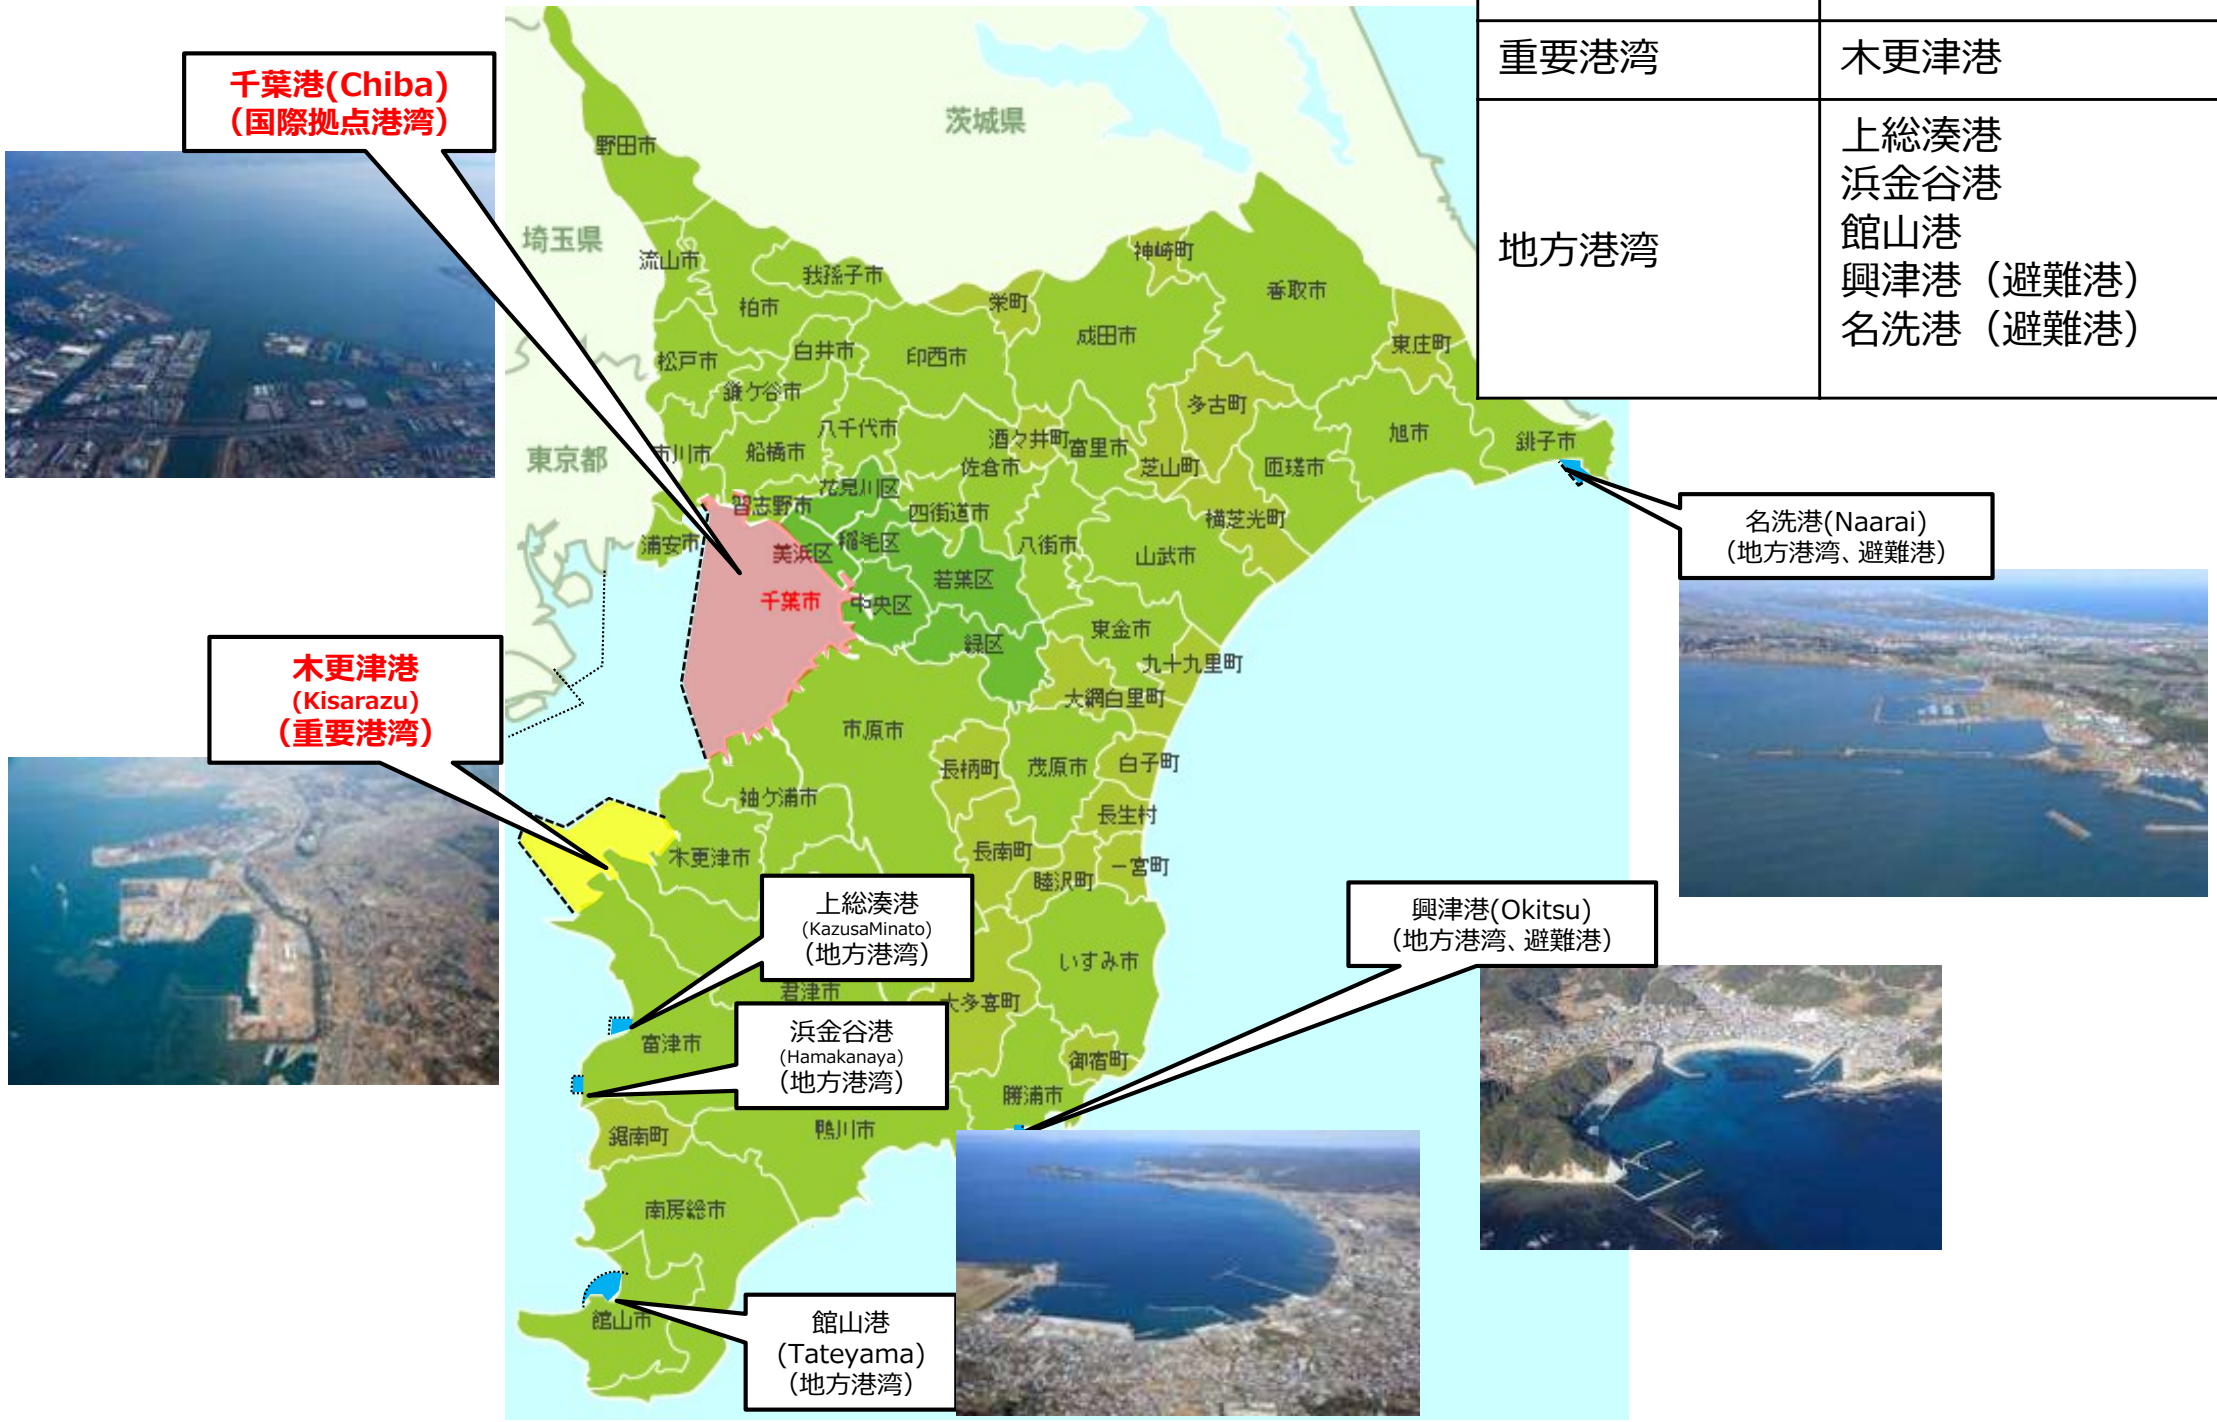

■主要プロジェクトの事業概要：港湾

千葉港千葉中央区複合一貫輸送ターミナル整備事業

■事業概要

千葉港千葉中央地区は、我が国の自動車産業、製造業（化学工業等）及び製紙業の海上輸送網の拠点となっており、内航ＲＯＲＯ船により輸送される貨物需要の増加を受けて、輸送船の大型化への対応が必要となっています。

このため、貨物需要の増大に伴う内航ＲＯＲＯ船の大型化に対応するとともに、大規模地震に対する耐震性能を有する複合一貫輸送ターミナル（水深９m）の整備中、岸壁及び泊地は、令和9年3月に完成予定。

■令和８年度予定

岸　壁）上部工・舗装工等

泊　地）浚渫工・基礎工等

防波堤）土質調査

（参考）RORO船による荷役状況

■主要プロジェクトの事業概要：港湾

千葉港千葉中央区複合一貫輸送ターミナル整備事業

出洲D岸壁状況写真（R8.3）

上部工-鉄筋組立

上部工-Co打設

上部工-Co打設後

■主要プロジェクトの事業概要：港湾

千葉港葛南中央地区航路（-12m）（予防保全事業）

■事業概要

航路全域において水深（-12m）を確保する必要があるため、航路浚渫を行う。

また、老朽化した付帯施設(防泥柵)が崩壊した場合、航路を埋没させる恐れがあることから、船舶航行に影響を及ぼすことが想定されるため、付帯施設(防泥柵)の補修を実施する。

■令和８年度予定

防泥柵補修

防泥柵上部コンクリートの欠損状況

■主要プロジェクトの事業概要：港湾

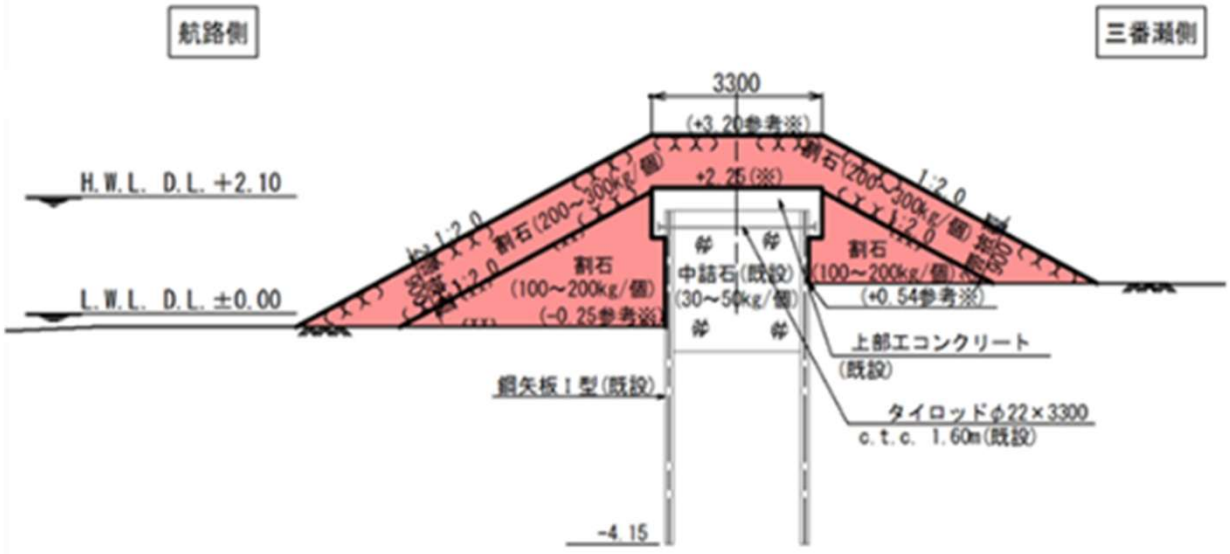

◆ 防泥柵補修断面（参考）

■主要プロジェクトの事業概要：海岸

千葉港海岸直轄海岸保全施設整備事業

■事業概要

千葉港海岸直轄海岸保全施設では、台風等による高潮や首都直下地震及び同地震に伴う津波に備えるため、海岸保全施設の嵩上げ及び耐震対策等を実施することで、地域の安全・安心を確保する。

■令和８年度予定

〇日の出胸壁

本体工、上部工、裏込工

〇海老川水門（R8.2～R11.9）

浚渫工、仮設工、本体工

整備前（現状）	整備後
高潮によって背後地が浸水。	高潮による背後地の浸水を防止。



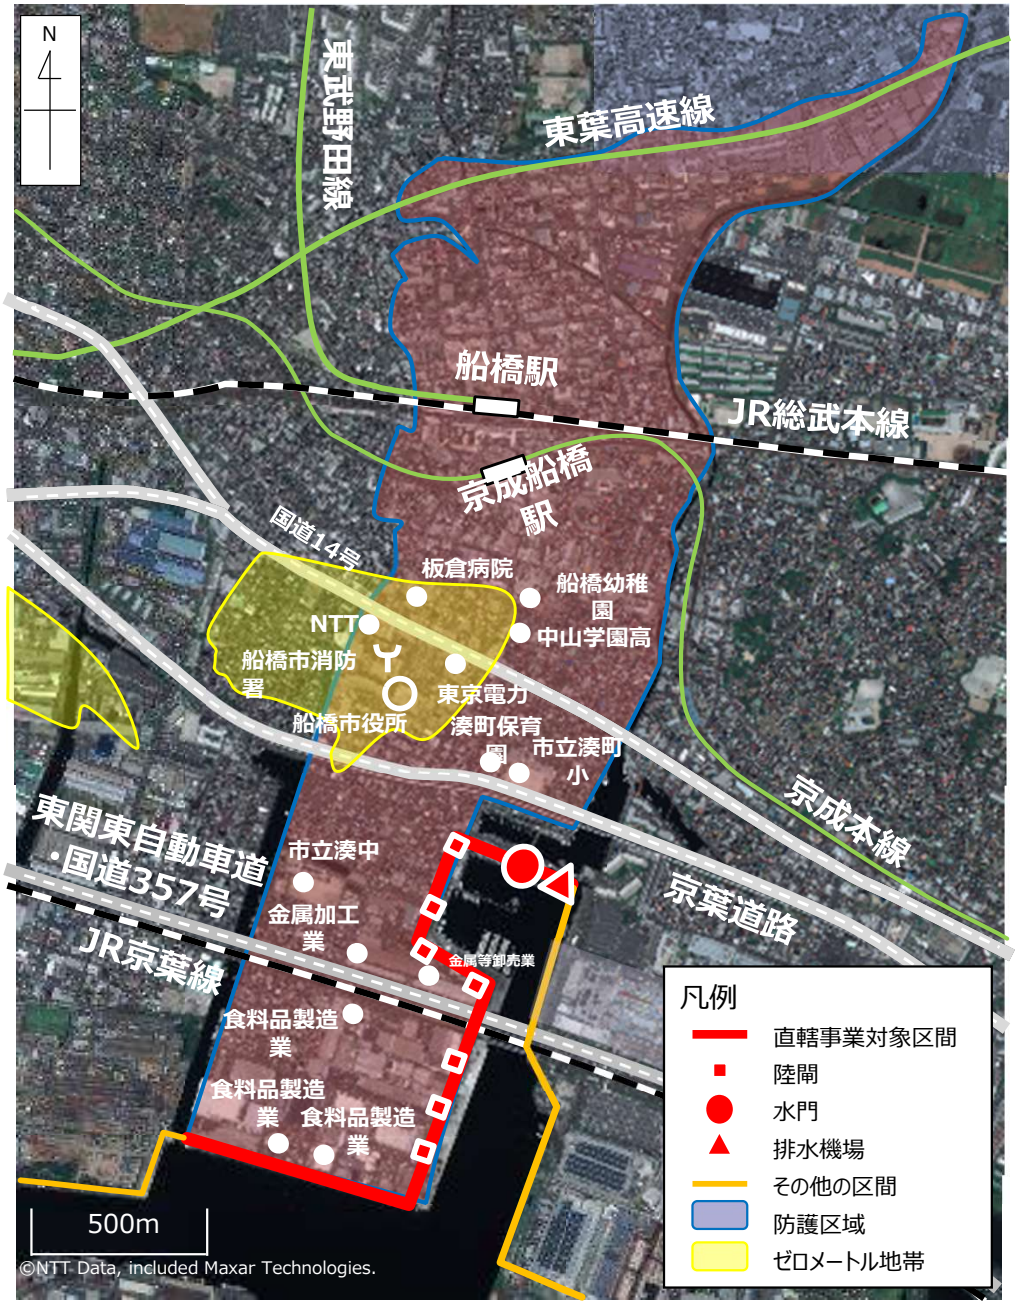
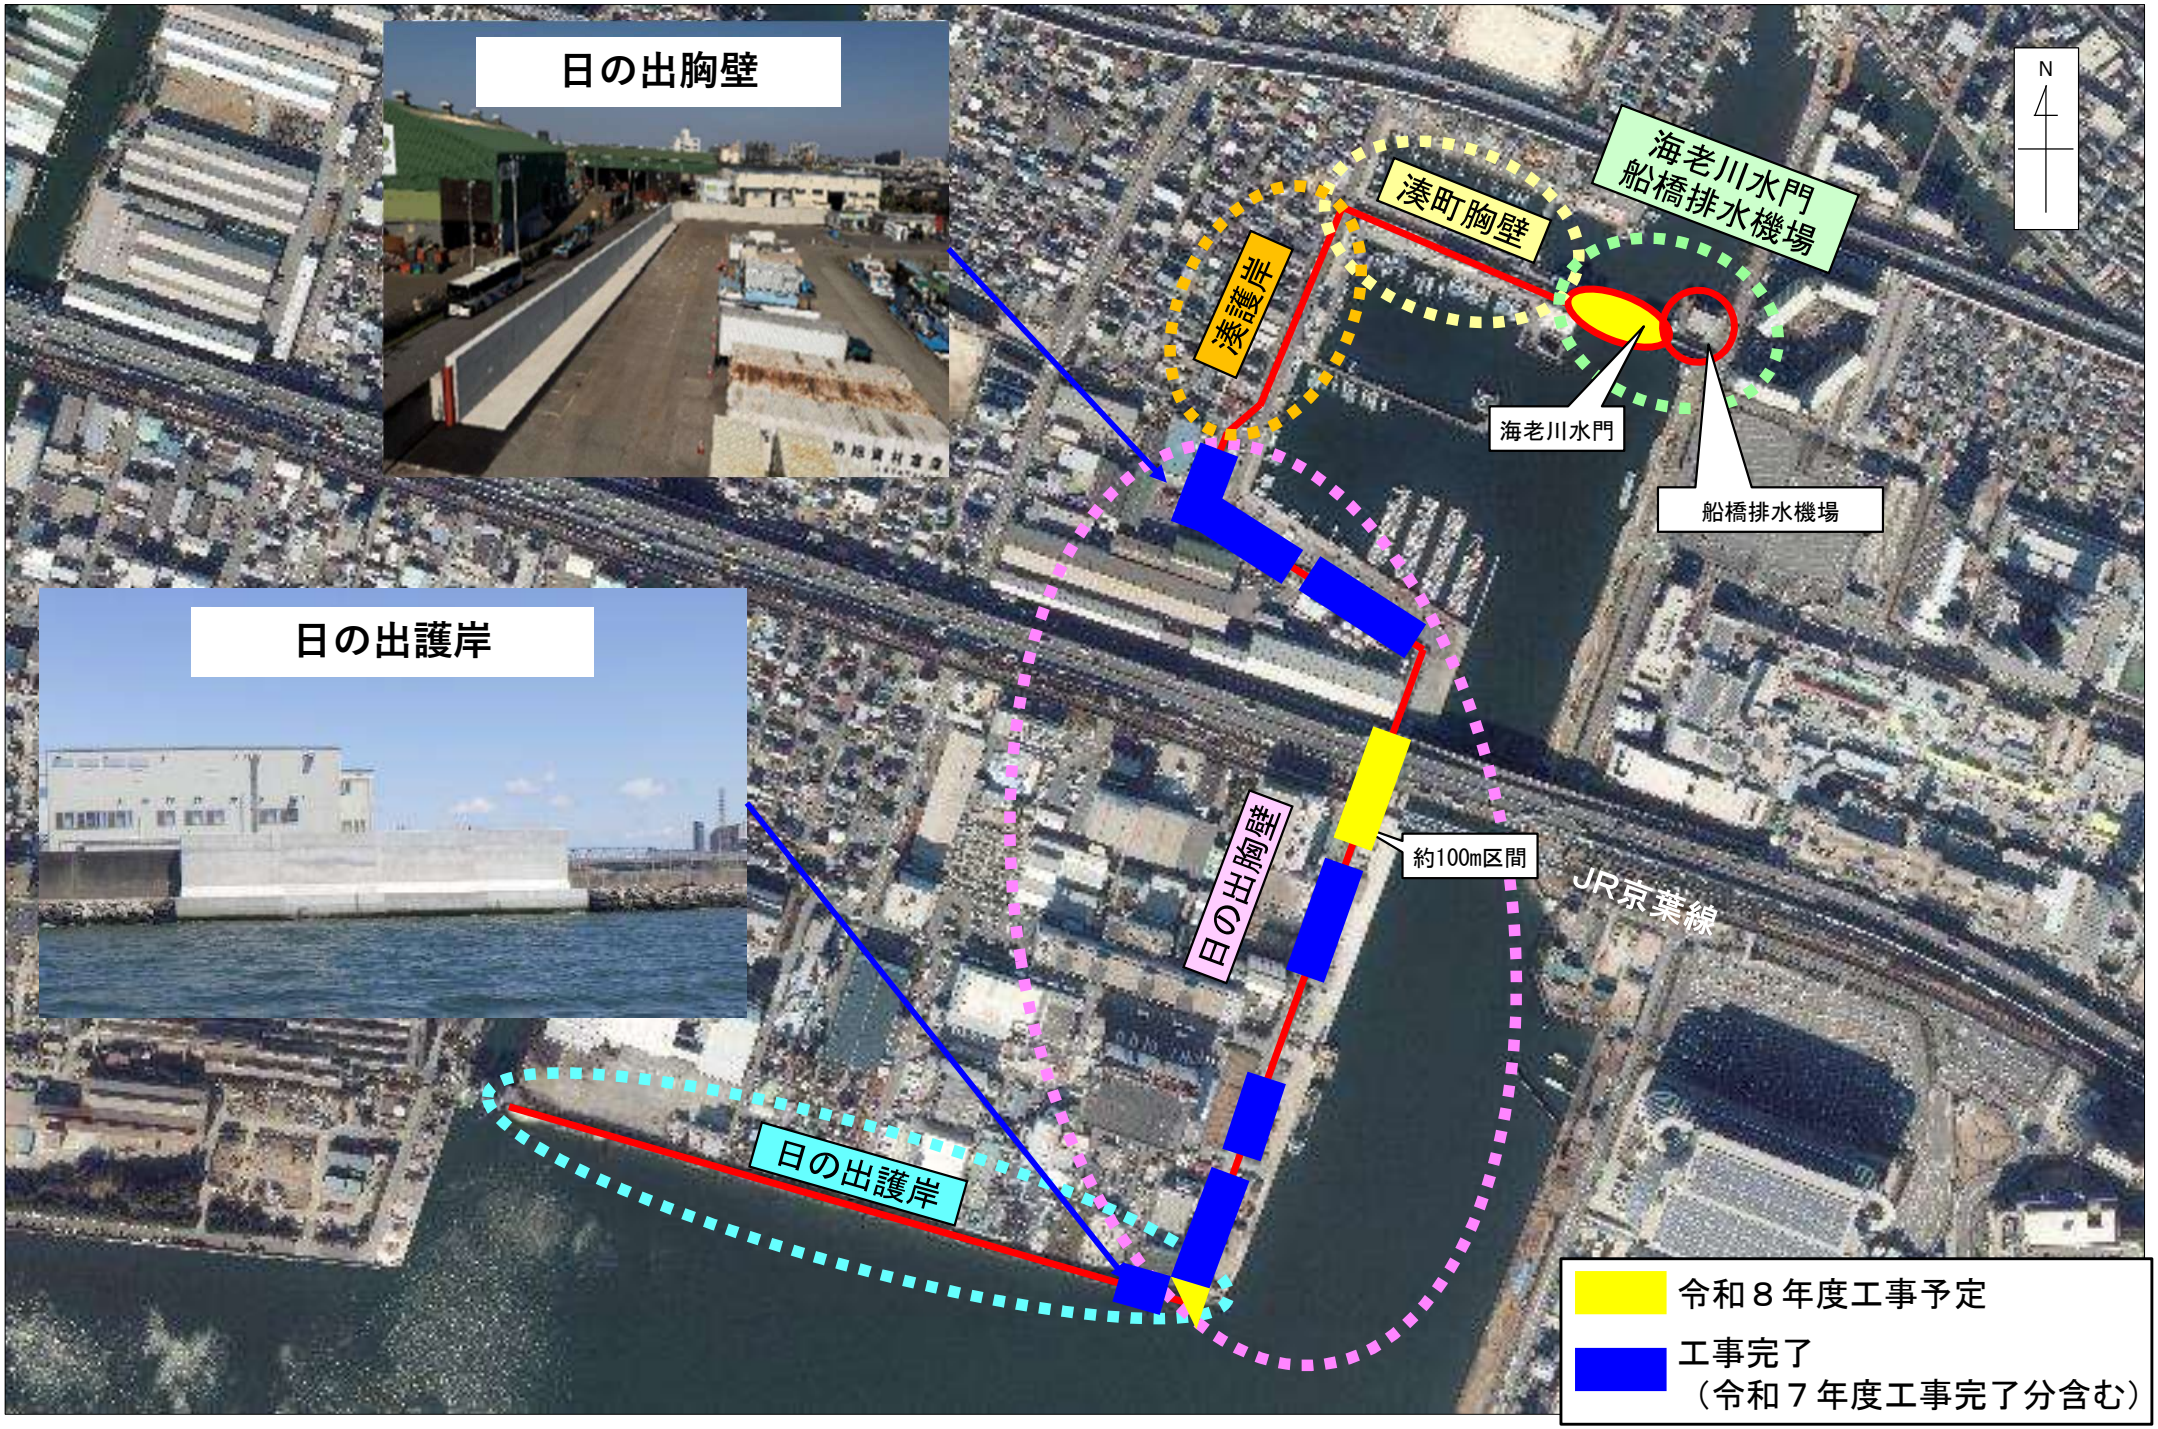
■主要プロジェクトの事業概要：海岸
